


Revidert fremdriftsplan
per 22.08.2024
Kirkedalsveien VA-anlegg

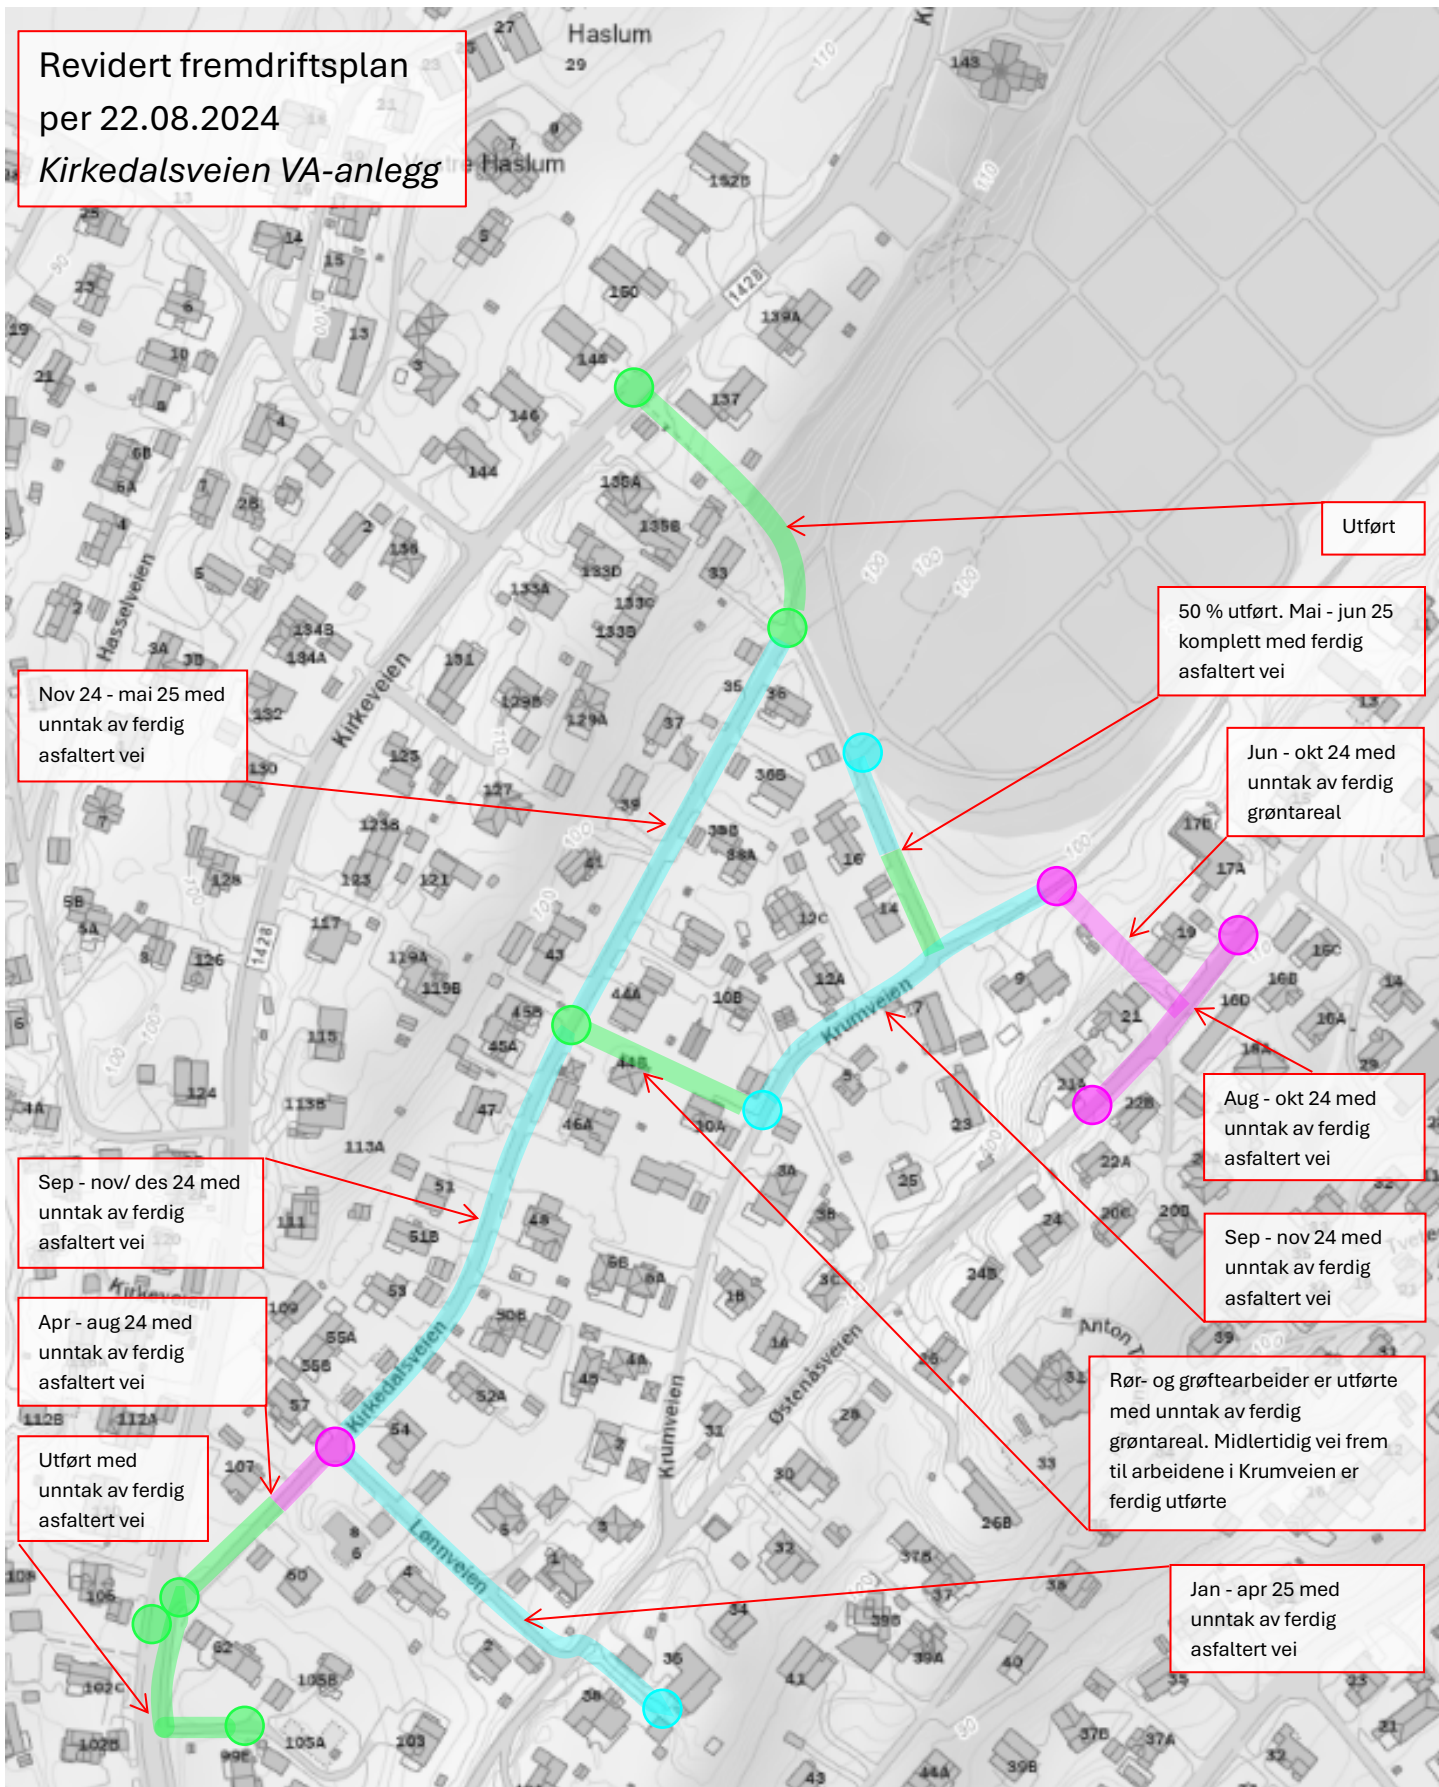

Utført

50 % utført. Mai - jun 25
komplett med ferdig
asfaltert vei

Jun - okt 24 med
unntak av ferdig
grøntareal

Aug - okt 24 med
unntak av ferdig
asfaltert vei

Sep - nov 24 med
unntak av ferdig
asfaltert vei

Rør- og grøftarbeider er utførte
med unntak av ferdig
grøntareal. Midlertidig vei frem
til arbeidene i Krumveien er
ferdig utførte

Jan - apr 25 med
unntak av ferdig
asfaltert vei

Nov 24 - mai 25 med
unntak av ferdig
asfaltert vei

Sep - nov/ des 24 med
unntak av ferdig
asfaltert vei

Apr - aug 24 med
unntak av ferdig
asfaltert vei

Utført med
unntak av ferdig
asfaltert vei
