


Revidert fremdriftsplan  
per 22.08.2024  
Kirkedalsveien VA-anlegg

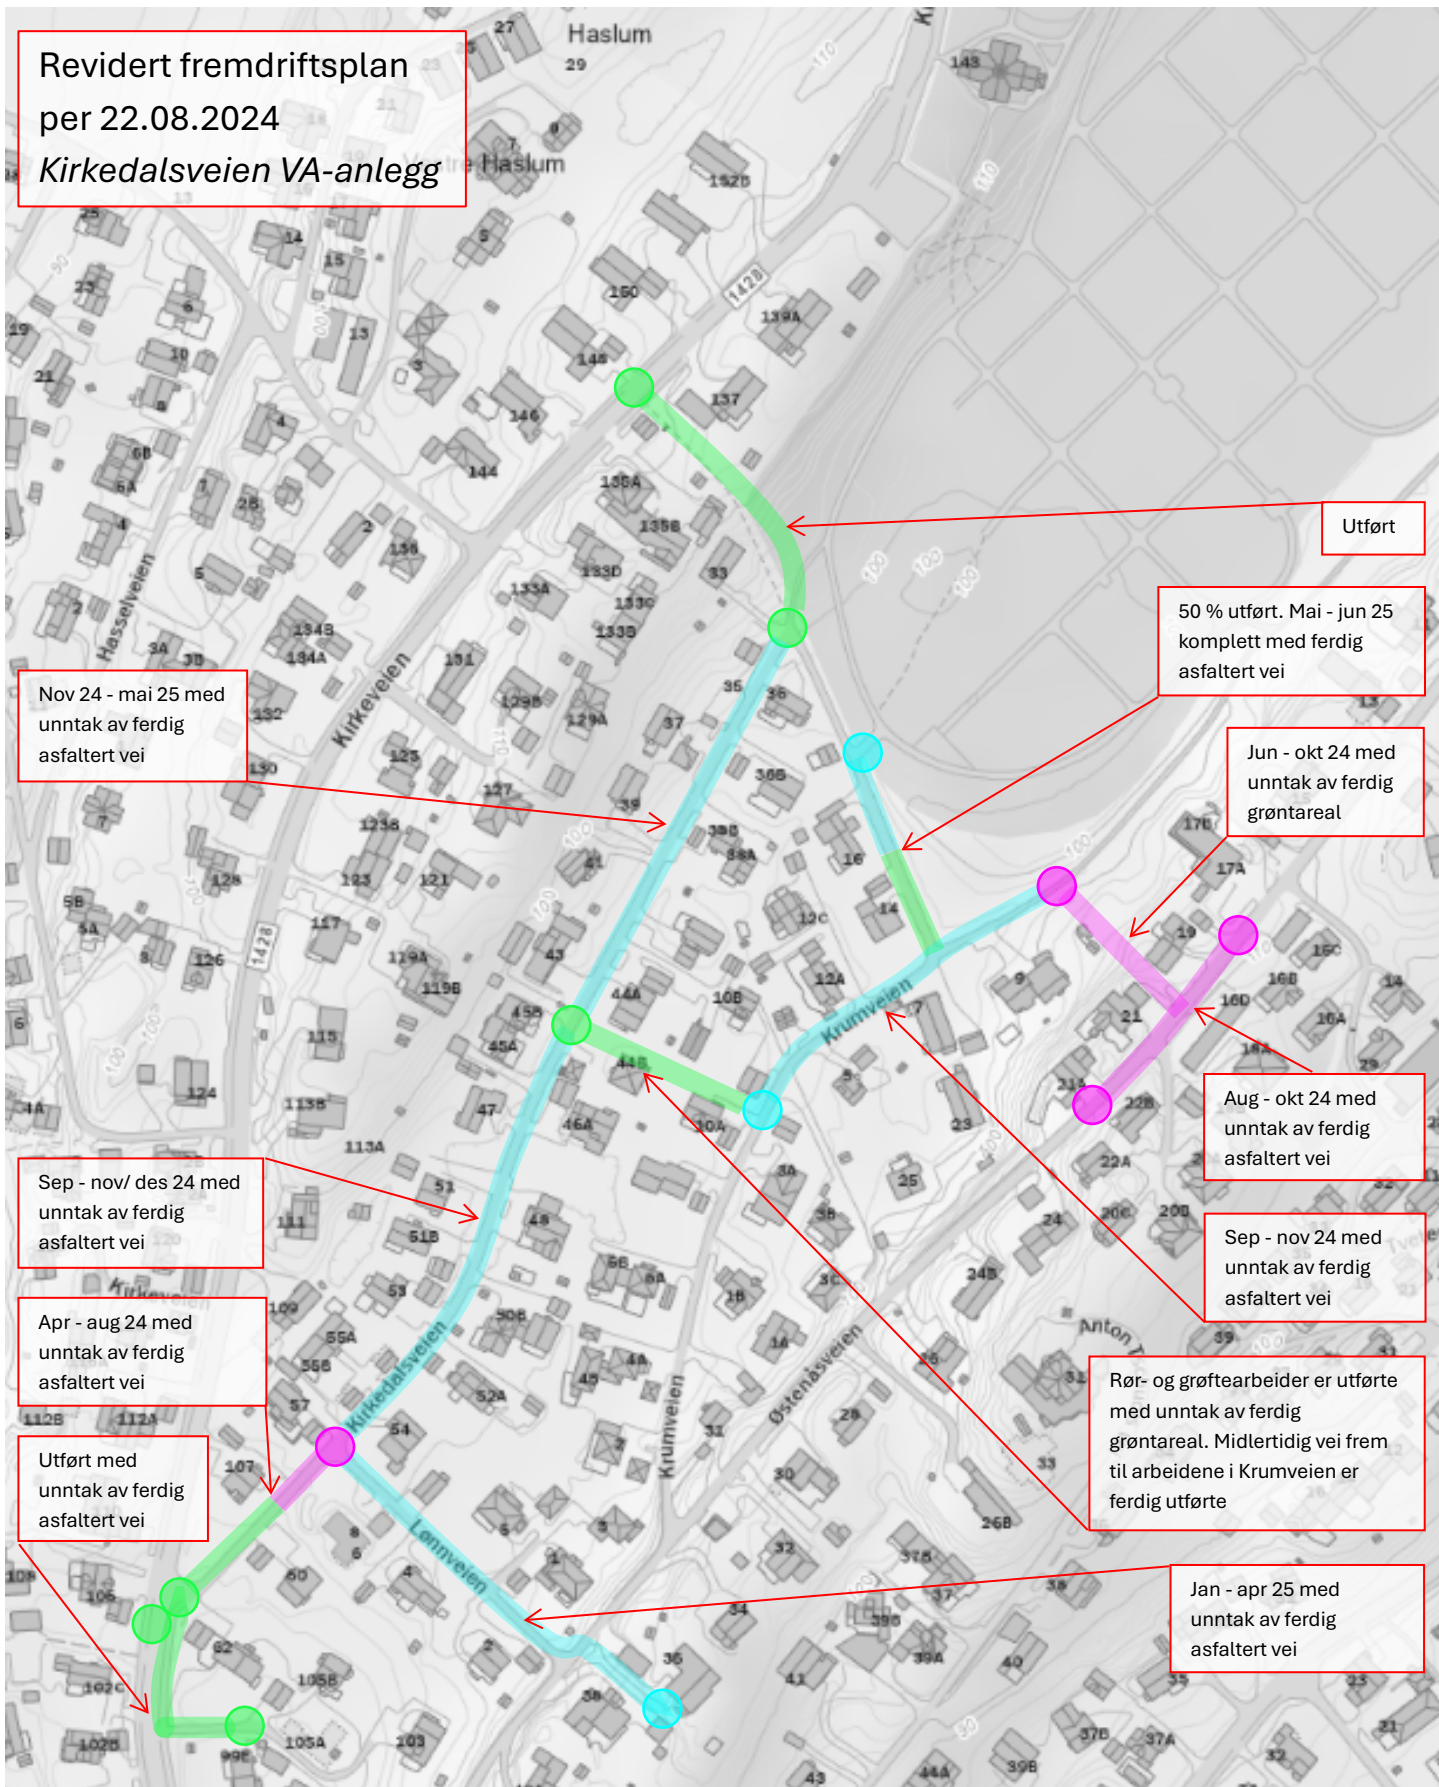

Nov 24 - mai 25 med unntak av ferdig asfaltert vei

50 % utført. Mai - jun 25 komplett med ferdig asfaltert vei

Jun - okt 24 med unntak av ferdig grøntareal

Aug - okt 24 med unntak av ferdig asfaltert vei

Sep - nov/ des 24 med unntak av ferdig asfaltert vei

Sep - nov 24 med unntak av ferdig asfaltert vei

Apr - aug 24 med unntak av ferdig asfaltert vei

Rør- og grøftarbeider er utførte med unntak av ferdig grøntareal. Midlertidig vei frem til arbeidene i Krumveien er ferdig utførte

Utført med unntak av ferdig asfaltert vei

Jan - apr 25 med unntak av ferdig asfaltert vei

Utført


Trafikkavvikling:  
Kirkedalsveien VA-anlegg  
September – november 2024

Kirkedalsveien stenges i dette området for biltrafikk i perioden september - oktober 2024. Forbehold om forlengelse. Gang- og sykkelvei er etablert på siden av inngjerdet område for anleggsarbeid

Østenåsveien er stengt i dette området for biltrafikk i perioden august - oktober 2024. Forbehold om forlengelse. Gang- og sykkelvei er etablert på siden av inngjerdet område for anleggsarbeid

Midlertidig vei etableres for biltrafikk fra Kirkedalsveien til Krumveien frem til arbeidene i Krumveien er ferdig utførte

Krumveien er stengt i dette området for biltrafikk i perioden september - november 2024. Forbehold om forlengelse. Gang- og sykkelvei etableres på siden av inngjerdet område for anleggsarbeid

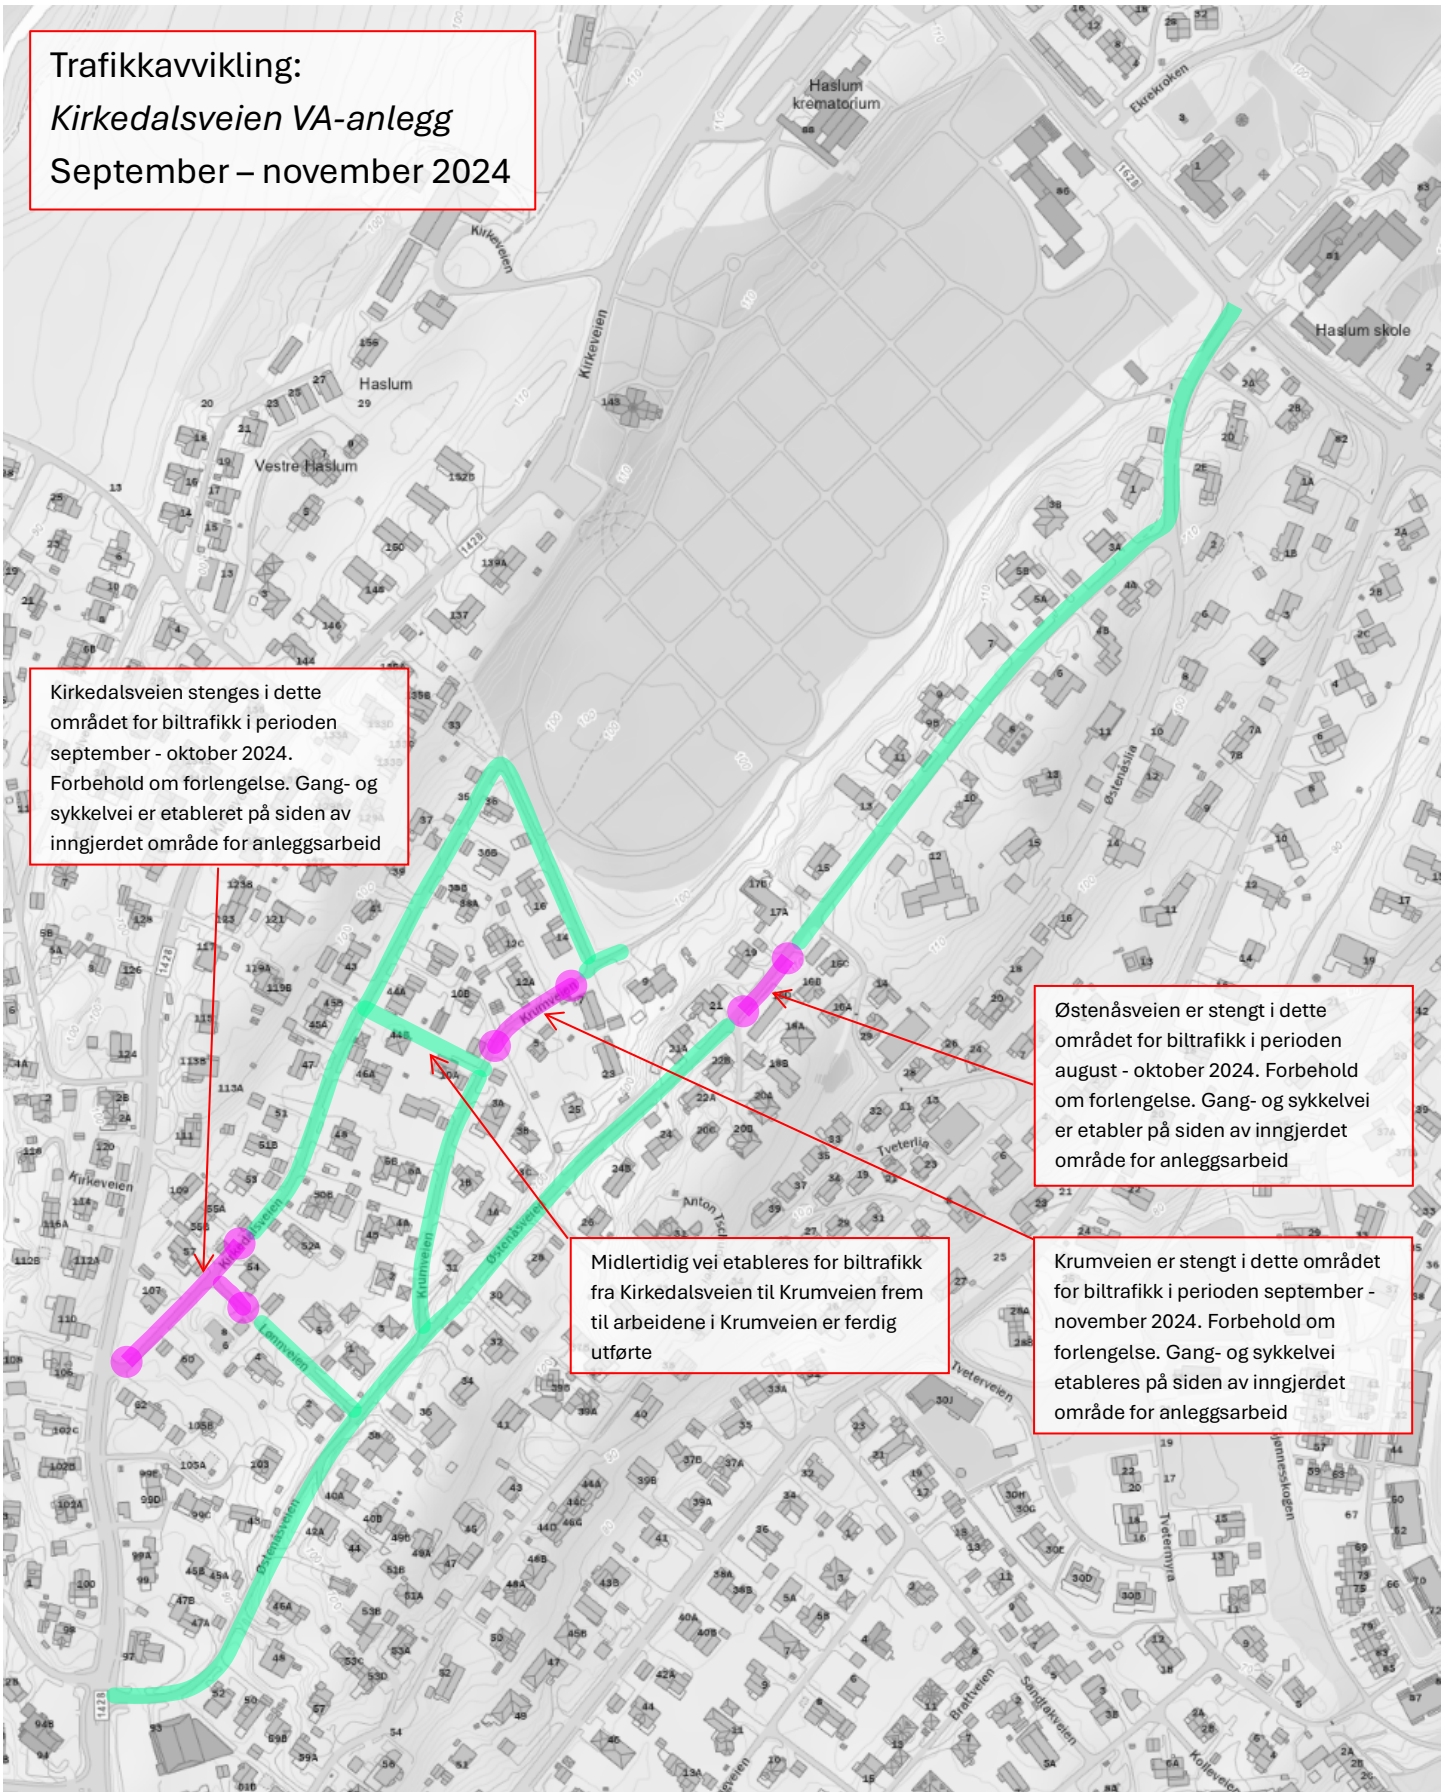



Abonnenter av vann og avløp  
tilhørende prosjektet:  
*Kirkedalsveien VA-anlegg*  
Desember 2024 – juni 2025

